

Projet d'implantation d'un logiciel métier chez "NordicSport"

10 juin 2026

Joris DILLER Corporation

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

24 mars 2025 - 10 mai 2025

Avancée

0%

Tâches

25

Ressources

5

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Phase 1. Lancement Du Projet	24/03/2025	26/03/2025
1.1 Réunion de lancement	24/03/2025	24/03/2025
1.2 Analyse des besoins	25/03/2025	25/03/2025
1.3 Validation du cahier des charges	26/03/2025	26/03/2025
Phase 2. Préparation Technique	27/03/2025	04/04/2025
2.1 Préparation du serveur	27/03/2025	31/03/2025
2.2 Installation du logiciel métier	01/04/2025	02/04/2025
2.3 Configuration Initiale	03/04/2025	04/04/2025
Phase 3. Personnalisation	03/04/2025	16/04/2025
3.1 Création des utilisateurs	03/04/2025	07/04/2025
3.2 Développement des personnalisations	07/04/2025	11/04/2025
3.3 Intégration avec l'ancien système	07/04/2025	11/04/2025
3.4 Tests techniques	14/04/2025	16/04/2025
Phase 4. Recette Fonctionnelle	17/04/2025	28/04/2025
4.1 Tests utilisateurs	17/04/2025	22/04/2025
4.2 Correction des anomalies	23/04/2025	25/04/2025
4.3 Validation Finale	28/04/2025	28/04/2025
Phase 5. Mise en Production	02/05/2025	07/05/2025
5.1 Sauvegarde Systeme	02/05/2025	02/05/2025
5.2 Déploiement Final	05/05/2025	06/05/2025
5.3 Vérification Post-déploiement	07/05/2025	07/05/2025
Phase 6. Formation	17/04/2025	09/05/2025
6.1 Préparation des supports	17/04/2025	22/04/2025
6.2 Sessions de Formations	23/04/2025	29/04/2025

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
6.3 Assistance au démarrage	07/05/2025	09/05/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de Projet (CP)	Chef de Projet (CP)
Technicien SIO (TS)	Technicien SIO (TS)
Développeur (DEV)	Développeur (DEV)
Formateur (FORM)	Formateur (FORM)
Référent Client (RC)	Référent Client (RC)

Projet d’implantation d’un logiciel métier chez “NordicSport”

10 juin 2026

Diagramme de Gantt

5

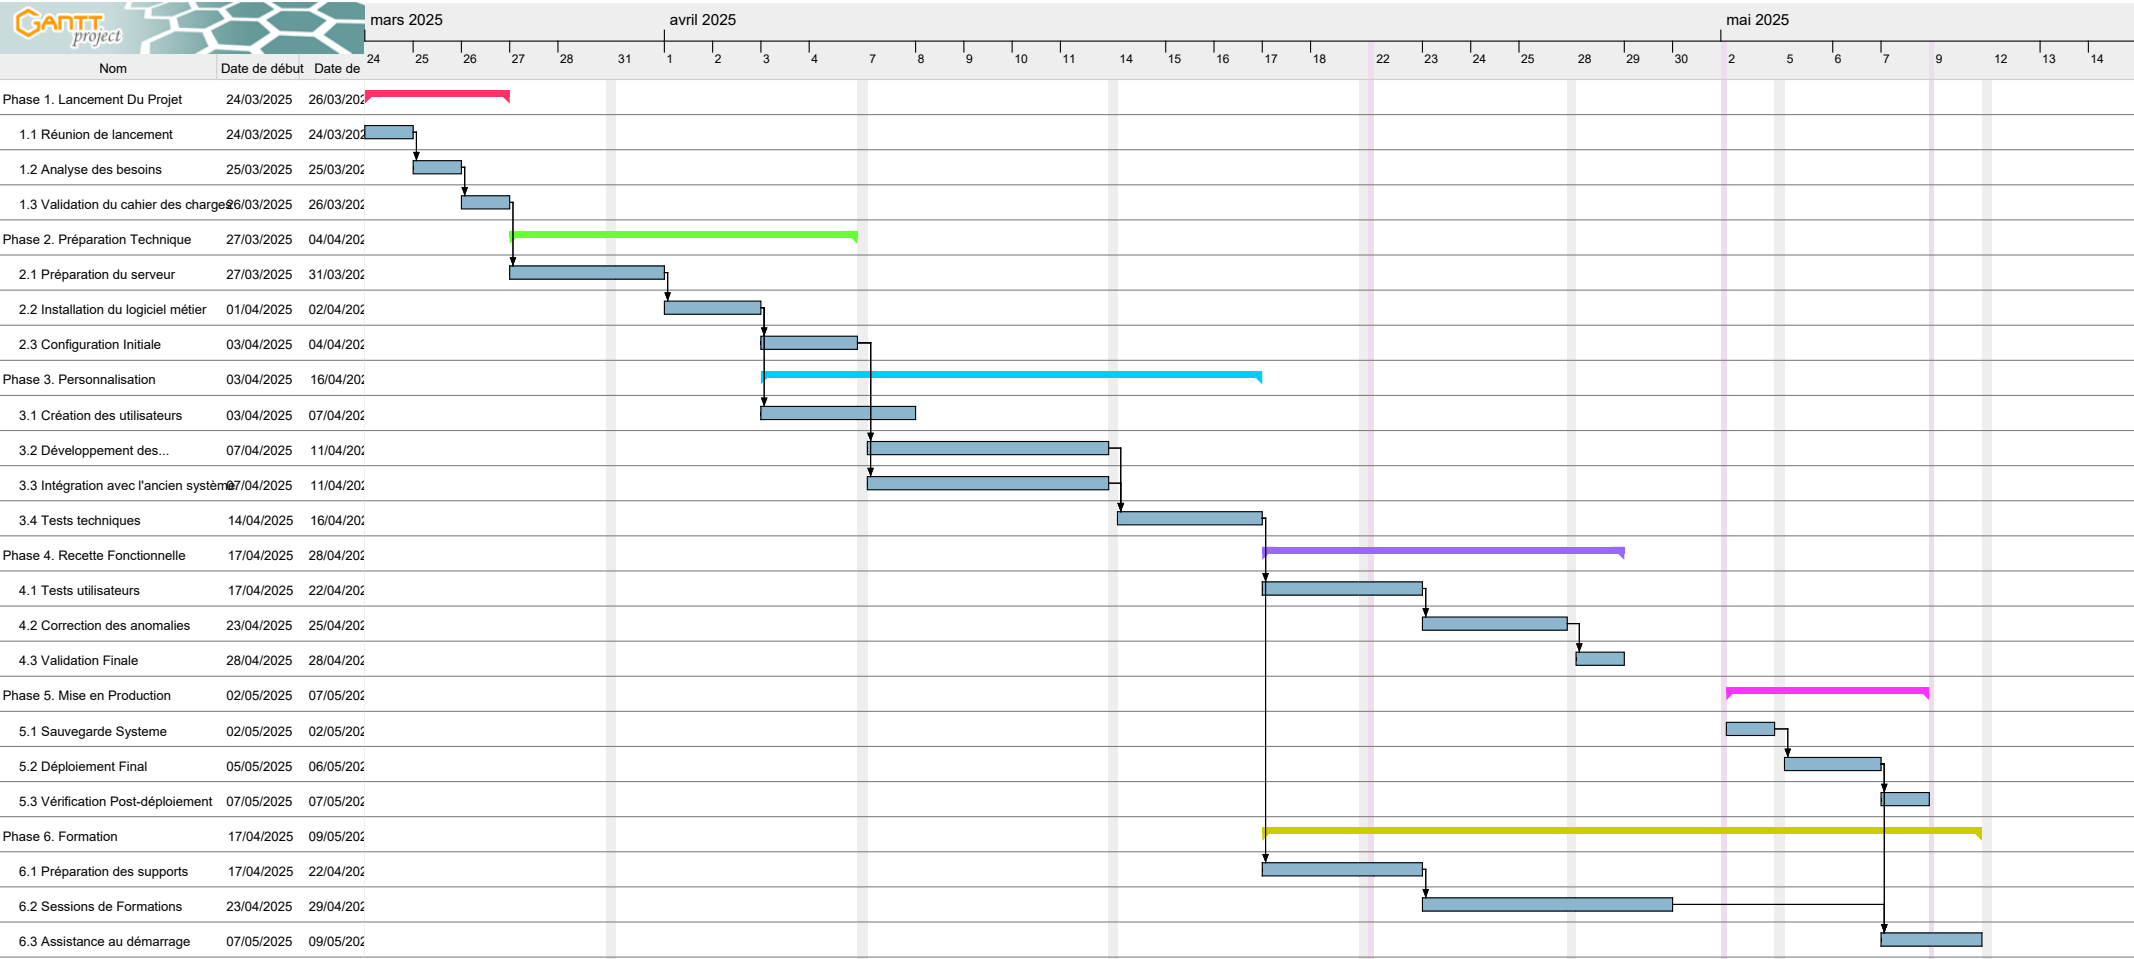


Diagramme des Ressources

